

水道管リニューアル工事の実施

考えよう街づくり 著者
平成30年02月19日

数年前に第一光ヶ丘自治会地区から開始された、南街地域の耐震性向上に向けた水道管リニューアル(交換)作業は、本年度は南街5丁目地域の工事が昨年の7月頃より開始され、計画では本年7月完工で工事が進められています。

現在工事は仮本管の敷設に続き、仮本管と個人宅への接続がほぼ終了の段階になっております。今後本管の敷設(交換)に続き個人宅への接続(ステンレス管の使用)が開始されます。今般その工事状況を撮影してみました。

業務用管での仮本管への接続状況



個人宅の場合



仮本管への接続工事状況




引き込み管確認



あり本管への接続作業




接続完了



接続部道路標識



現本管接続部止水作業

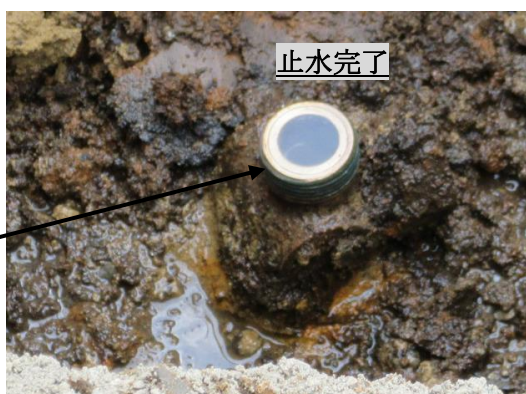

仮本管から個人宅への引き込み接続作業終了



埋め戻し作業重機

